

**ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL 06 DE MAYO DEL 2015**



Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas se reunieron a las 12:00 horas en la sala de juntas de Regidores para atender el siguiente orden del día:

Como primer punto del orden del día se verifica la asistencia de los integrantes de la comisión: Regidores Zuri Medina Reyes Coordinadora de la Comisión, José Márquez Puentes Secretario y Alejandro José Seade Terrazas Vocal como invitados el Ing. Manuel Ortega Director General de Obras Públicas, el Ing. Ernesto Mendoza Viveros de la Dirección de Obras Públicas, Marco Cedillo Asesor de la fracción edilicia del PAN y Ángeles Apodaca, asesores de la fracción edilicia del PRI.

Como segundo punto en el orden del día se presenta la minuta de la sesión anterior para su aprobación.

Como tercer punto en el orden del día se solicita al Ing. Ortega, Director de Obras Públicas presente un informe respecto al Plan de Movilidad Urbana, avances y los alcances.

El Ing. Mendoza informa que se tiene un 84% de avance, se tiene programada la apertura al tráfico de la Av. Ejército Nacional en el tramo de la Av. Plutarco Elías Calles a la Carretera Panamericana.

El Puente de la Av. Teófilo Borunda a Av. Oscar Flores ya está por concluir la construcción al igual que el que se ubica en la Av. Paseo de la Victoria y la Calle Piña.

**H. CUERPO DE REGIDORES**


Al Sur de la Uva-Piña ( Blvd. Zaragoza y Miguel de la Madrid) solo está pendiente la señalización y semaforización, y comentan que se está presentando el problema relacionado a que vendedores se están apropiando de los camellones y que se corre el riesgo de que empiecen a dañar las banquetas para colocar estacas para sostener las carpas de los puestos y esto representa un problema para la garantía que se va a ejercer.

en algunos de los tramos no se ha podido avanzar porque no se han concluido los tramites de las afectaciones.

En la Calle Pavorreal se presento el problema de que anteriormente era un basurero y se tuvo que mejorar todo el terreno para poder continuar con la construcción de la vialidad.

Se comenta que el equipo de semaforización llega aproximadamente para el día 20 de junio y se tiene contemplado que para el mes de agosto se esté realizando la revisión de todas y cada una de las vialidades concepto por concepto para recibir las obras y que empiecen a correr los 20 años de garantía del PMU.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 13:00 horas.



## LISTA DE ASISTENCIA

### Reunión de la Comisión de Obras Públicas

**Fecha:** 06 de mayo del 2015

**Hora:** 12:00


**Lugar:** Sala de juntas de Regidores

#### Integrantes de la Comisión:



ZURI SADAY MEDINA REYES Coordinadora

JOSÉ MÁRQUEZ PUENTES Secretario

ALEJANDRO JOSÉ SEADE  
TERRAZAS Vocal

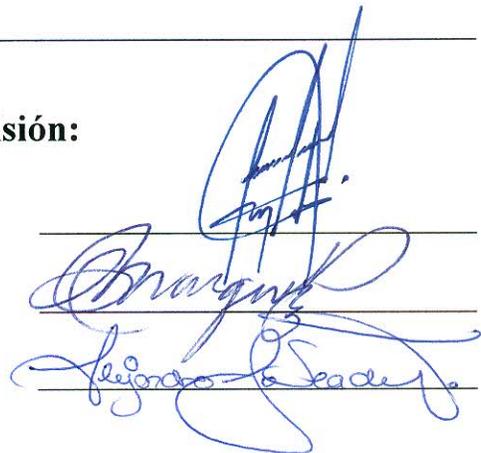

#### Asistentes:

Nombre	Dependencia	Firma
Ernesto Mendora V.	DOP	
Manuel Ortega R.	D.O. R	
MARCO A. CEDILLO	ASESOR REG. PAN	
Angeles Apodaca S.	Asesor fraccion PRI	
