

**ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 10 DE MARZO DEL 2015**



Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas se reunieron a las 12:30 horas en la sala de juntas de Regidores para atender el siguiente orden del día:

Como primer punto del orden del día se verifica la asistencia de los integrantes de la comisión: Regidores Zuri Medina Reyes Coordinadora de la Comisión, José Márquez Puentes Secretario y Alejandro José Seade Terrazas Vocal como invitados el Ing. Manuel Ortega Director General de Obras Públicas y el Ing. Ernesto Mendoza Viveros asesor del PMU, Marco Cedillo Asesor de la fracción edilicia del PAN, Fabián Soto y Ángeles Apodaca, asesores de la fracción edilicia del PRI.

Como segundo punto en el orden del día se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior ya que con antelación fue aprobada.

Como tercer punto en el orden del día se solicita al Ing. Ortega, Director de Obras Públicas explique los ajustes al Plan de Movilidad Urbana expresados por el Tesorero Municipal el día de ayer ante los medios de comunicación.



El Ing. Ortega comenta que se suspenderán 12 tramos los cuales los determino el Comité tomando en cuenta los criterios de tiempo y aspectos financieros. Se cometa que uno de los factores que más ha afectado a los avances de las obras tiene que ver con la instalación de

agua, gas, líneas telefónicas, fibra óptica e instalaciones eléctricas ya que el compromiso del municipio ante la empresa Movicom es entregar tramos liberados ya listos para la pavimentación de las vialidades, situación que en la mayoría de los casos no ha sido con la rapidez que se tenía previsto; así como los problemas presentados en las negociaciones de las afectaciones ya que en muchos de los casos no se cuenta con la documentación que comprueba la legal propiedad de los terrenos a afectar.

En cuestiones financieras se ha tomado la decisión de recortar estos 12 tramos para evitar un endeudamiento mayor a lo proyectado ya que el proyecto se vio afectado por el aumento del 5% de IVA y la extensión en los tiempos del contrato.

Se informa que los tramos próximos deberán abrirse hasta antes del 30 de mayo y la obra deberán concluir en junio, sin mayores compromisos económicos para el municipio.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 13:30 horas.



LISTA DE ASISTENCIA

Reunión de la Comisión de Obras Públicas

Fecha: 10 de marzo del 2015

Hora: 12:30


Lugar: Sala de juntas de regidores

Integrantes de la Comisión:





ZURI SADAY MEDINA REYES Coordinadora

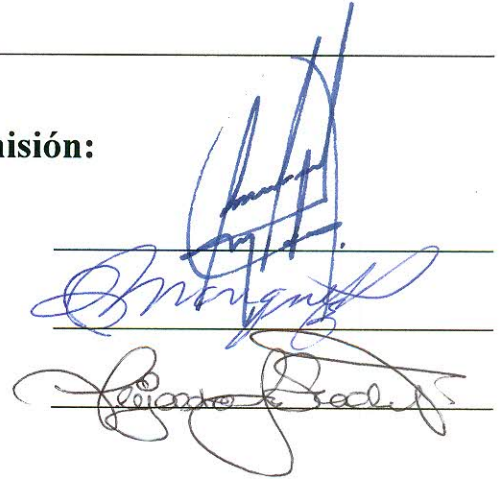JOSÉ MÁRQUEZ PUENTES Secretario

ALEJANDRO JOSÉ SEADE
TERRAZAS Vocal



Asistentes:

Nombre	Dependencia	Firma
Ing. Manuel Ortiz G. L.	O.P.	
Ernesto Méndora V.	O.P.	
Fabian Soto Martinez	Asesor Regidores PRI	
MARCO A. CEDILLO	ASESOR REGID. PAN	
Angeles Aparlaca S.	Asesor Regidores PRI	
